


市街地再開発事業 工程表

令和7年10月21日時点

作業内容	令和7年			令和8年		備考
	10月	11月	12月	1月	2月	
駅ビル棟						
基礎工事						防火水槽の施工は11月下旬完了予定
掘削・基礎躯体工事						
住宅棟						
基礎工事						防火水槽の施工は11月中旬完了予定
駐輪場						
基礎工事						
掘削・基礎躯体工事						

○市街地再開発事業進捗状況（10月21日時点）

・位置図

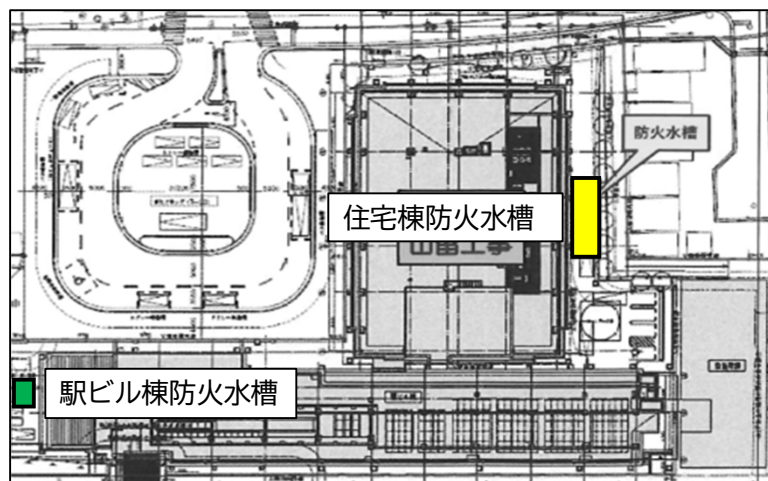

・駅ビル棟用防火水槽（40m³）掘削
（※寸法 6.8m×3.0m×高さ2.0m）

掘削状況



・住宅棟防火水槽（80m³）
（※寸法 11.8m×3.1m×高さ2.2m）

基礎コンクリート打設状況

